

## **Relatório de Entrega da grelha de entrada e serviços adicionais que foram feitos.**

Segue finalização dos serviços das grelhas de entrada e saída conforme nota fiscal e acordo entre as partes.

O serviço contratado:

(Entrada garagem)

1- Troca da grelha da entrada.

(Saída garagem)

2- Troca da grelha de saída;

3- Troca do trilho do portão parte de baixo;

4- Recuperação do fundo da caixa de recebimento de águas pluviais onde fica a grelha;

5- Recuperação dos berços com Graute;

6- Fixação do trilho com Graute;

7- Passagem dos fios com caixa de passagem;

Serviços Extras que foram executados:

(Saída garagem)

1- Troca do trilho superior do portão;

2- Troca de guia por roldanas do portão;

3- Complemento dos buracos encontrados no fundo da caixa.

4- Concretagem com aditivo para maior ancoragem do concreto novo com o velho.

5- Concreto mais plastificado para que entrasse um pouco nas fissuras encontradas e misturasse com os pedriscos colocado.

6- Maior quantidade de graute por conta da quebra.

7- Maior quantidade de concreto com 40cm.

- 8- Maior quantidade de mão de obra passando de 2 dias para 7 dias.
- 9- Corte do piso para queda de água da caixa de águas pluviais para o esgoto. (ligação Direta)

Valor dos serviços adicionais:

R\$ 3.500,00 ( três mil e quinhentos reais)

Segue fotos do antes:



Fotos durante:



Corte do piso para retirada da grelha antiga e troca do trilho.




**Infiltração.**

Buraco no funcho entrado por baixo da garagem com aproximadamente 1,30m na lateral.



Fixação do aro da grelha

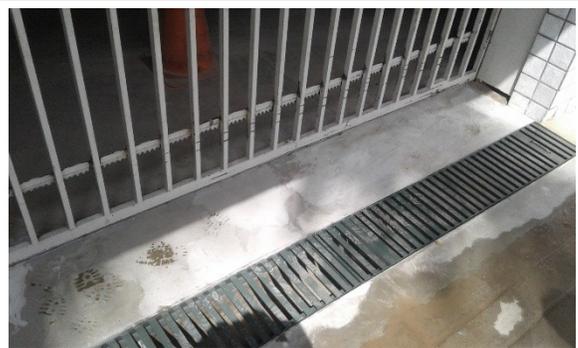

Graute Hagen que chega à 40 MPa com 28 dias



Caixa de passagem resistente a água a mesma utilizada em piscina.



Grelha em ferro.



Grelha da (entrada)





# Soluções Ambientais Sustentáveis

Distribuição, Representação e Construção

Diogo Bezerra Rego  
Diretor da SAS
